



AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ



AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

İl Vaziyet Planı

Geldingen Ovası
Sulaması 2. Kısım
9475 ha

Geldingen Ovası
Sulaması 3. Kısım
2735 ha

Aşağı Çekerek 1.Merhale Projesi Zile,
Maşat Reşadiye, Çekerek ve Mamure
(Ovaları Sulaması 3.Kısım (4146 ha)

Aşağı Çekerek 1.Merhale Projesi Zile,
Maşat Reşadiye, Çekerek ve Mamure
(Ovaları Sulaması 3.Kısım (759 ha)

Aşağı Çekerek 1.Merhale Projesi Zile,
Maşat Reşadiye, Çekerek ve Mamure
(Ovaları Sulaması 2.Kısım (2497 ha)

ÇEKEREK BARAJI
(İşletme)




AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması

1. Kısım

İhale Tarihi	31.01.2017
İhale Bedeli	34.395.800 TL
Sözleşme Tarihi	06.04.2017
Yüklenici	ASİL İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.
İşe Başlama Tarihi	18.04.2017
İş Bitim Tarihi (Sözleşme)	17.04.2019
İş Bitim Tarihi (Süre Uzatımlı)	18.08.2020
İş Artışı	-
Toplam Sözleşme Bedeli	34.395.800 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 36
Parasal Gerçekleşme	% 36
Proje Maliyeti (2019 B.F)	78.329.555 TL
Harcama (2018 Yılı Sonuna Kadar)(2019 B.F)	19.278.918 TL
Kalan İşlerin Tutarı	52.374.920 TL
2019 Yılı Ödeneği	7.044.994 TL
2019 Yılı Harcaması	6.675.717 TL

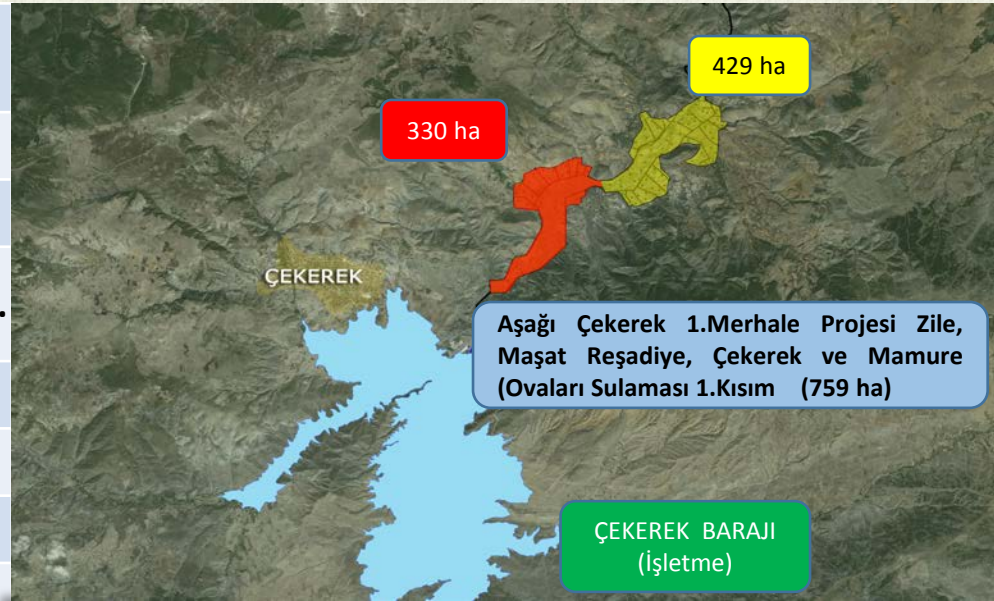

Sulama Şebekesi Tipi	Borulu
Sulama Alanı	759 ha
Cazibe (İhale Edilen Kısım)	759 ha
2019 yılı İnşaatı devam eden 330 ha	2020 ve sonrası hedefi 429 ha

Projenin Son Durumu: Anaboru hattının ilk 17 km'lik kısmı ile 759 ha alanın sulama şebekesi inşaatı yapılacaktır. 6 km platform kazısı tamamlandı. 3800'lük CTP boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, 3800'lük CTP boru döşeme işleminin 2.781 m lik kısmı tamamlanmıştır. Tünel imalatı tamamlandı. Enjeksiyon çalışmalarına başlanacaktır. 30.07.2019 tarih ve 483778 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile Öz Erka&Asil İnş.A.Ş iş ortaklığından Asil İnş.San.ve Tic. A.Ş devredilmiştir.

AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması

1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ



Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması

1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ



Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması

1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması
1. Kısım

Sulamadan Faydalanan Yerleşim Birimleri

- 1. Özören Köyü**
- 2. Gönülyurdu Köyü**
- 3. Kamışçık Köyü**
- 4. Sarıköy**
- 5. Akkılıç Köyü**



AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ



Aşağı Çekerek 1.Merhale Projesi Zile, Maşat Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 1.Kısım 2.Bölüm Malzeme Alımı

İhale Tarihi	27.06.2019
İhale Bedeli	16.399.800 TL
Sözleşme Tarihi	08.08.2019
Yüklenici	SUPERLİT BORU SANAYİ A.Ş.
İşe Başlama Tarihi	19.08.2019
İş Bitim Tarihi (Sözleşme)	18.08.2020
İş Bitim Tarihi (Süre Uzatımlı)	-
İş Artışı	-
Toplam Sözleşme Bedeli	16.399.800 TL
Fiziki Gerçekleşme	%
Parasal Gerçekleşme	%
Proje Maliyeti(2019 B.F)	23.281.156 TL
Harcama (2018 Yılı Sonuna Kadar)(2019 B.F)	-TL
Kalan İşlerin Tutarı	23.281.156 TL
2019 Yılı Ödeneği	- TL
2019 Yılı Harcaması	-TL



Karakteristikler

Projenin Son Durumu - Gerçekleşecek İmalatlar (Aşağı Çekerek 1.Merhale Projesi Zile, Maşat Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 1.Kısım Malzeme Alımı) işi tasfiye edilmiş olup 2.Bölüm olarak ikmale gidilmiştir.

Muhtelif çap ve basınç dayanımlarında 5.530 m CTP Boru ve Özel Parça alımı yapılacaktır. 19.08.2019 tarihinde işe başlanılmıştır.



AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 1. Kısım





AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması

2. Kısım

Su Kaynağı: ÇEKEREK BARAJI		Su Kaynağı: İşletmede	Su Kaynağı F.G. : %100	Sulama Alanı	2497 ha cazibe 3058 ha pompaj				
Ana kanal : -	Ana Boru:	Yerleşim Birimi Faydası: 11 köy		Sulama Şebekesi (C/P)	C/P				
Cazibe: 2 497	Pompaj: 3 058	Hm: 45/44		Pompaj Terfi Yüksekliği	-				
				İhale Tarihi	2020				
				Sözleşme Tarihi					
				Sözleşme Bedeli (TL)					
				İşe Başlama Tarihi					
				Son İş Bitim Tarihi					
				Yüklenici					
				2019 YILI					
				Sözleşmesine Göre 2019 Yılı Ödeneği (TL)					
				2019 Yılı Ödeneği (TL)					
				2019 Yılı Rev. Öd. (TL)					
				2019 Yılı Harc. (TL)					
				Parasal Gerç. (%)					
				Fiziki Gerç. (%)					
								Projenin Son Durumu - Gerçekleşecek İmalatlar – Darboğazlar	
								2019 Yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planı'nda 320.000.000 TL toplam keşif ve 1 TL nakit bedel ile (İ) olarak yer almaktadır. 2.497 ha cazibeli, 3.058 ha pompaj olmak üzere toplam 5555 ha alanın sulama şebekesi inşaatı yapılacaktır.	
				2019 yılı öncesi sulamaya hazır hale getirilen	2019 yılı sulamaya hazır hale getirilen	2019 yılı İnşaatı devam eden	2020 ve sonrası hedefi		
-	-	-	2497+3058 ha						



AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 2. Kısım

Sulamadan Faydalanan Yerleşim Birimleri

- | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Reşadiye Köyü | 5. Ağcakeçili Köyü | 9. Haremikişla Köyü |
| 2. Salur Köyü | 6. Yapalak Köyü | 10. Eskiderbent Köyü |
| 3. Yalinyazı Köyü | 7. Narlıkışla Köyü | 11. Kazıklı Köyü |
| 4. Büyüközlü Köyü | 8. Karaşeyh Köyü | |



AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması

3. Kısım ve 4. Kısım

Su Kaynağı: ÇEKEREK BARAJI		Su Kaynağı: İşletmede	Su Kaynağı F.G. : %100	Sulama Alanı	4146 ha cazibe 12970 ha pompaj
Ana kanal : -	Ana Boru:-	Yerleşim Birimi Faydası: 2 ilçe, 33 köy		Sulama Şebekesi (C/P)	C/P
Cazibe: 4 146 ha	Pompaj: 12 970	Hm: 13/50/95/109		Pompaj Terfi Yüksekliği	-
				İhale Tarihi	2020
				Sözleşme Tarihi	
				Sözleşme Bedeli (TL)	
				İşe Başlama Tarihi	
				Son İş Bitim Tarihi	
				Yüklenici	
				2019 YILI	
				Sözleşmesine Göre 2019 Yılı Ödeneği (TL)	
				2019 Yılı Ödeneği (TL)	
				2019 Yılı Rev. Öd. (TL)	
				2019 Yılı Harc. (TL)	
				Parasal Gerç. (%)	
				Fiziki Gerç. (%)	
				Projenin Son Durumu - Gerçekleşecek İmalatlar – Darboğazlar	
				2019 Yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planı'nda 130.000.000 TL toplam keşif ve 1 TL nakit bedel ile (İ) olarak yer almaktadır. 4.146 ha cazibeli Bölüm 3. Kısım, 12.970 ha pompaj ılı Bölüm 4. Kısımda yer almakta olu toplam 17.116 ha alanın sulama şebekesi inşaatı yapılacaktır. 4. Kısım henüz Yatırım Programına dahil edilmemiştir.	
2019 yılı öncesi sulamaya hazır hale getirilen	2019 yılı sulamaya hazır hale getirilen	2019 yılı İnşaatı devam eden	2020 ve sonrası hedefi		
-	-	-	4146 ha		



AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması
3. ve 4. Kısım

Sulamadan Faydalanan Yerleşim Birimleri

- | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Zile İlçesi | 13.Karakuzu Köyü | 25.Bazlambaç Köyü |
| 2. Aydıncık İlçesi | 14.Kireçli Köyü | 26.Büyüktoraman Köyü |
| 3. Alayurt Köyü | 15.Kurşunlu Köyü | 27.Kazankaya Köyü |
| 4. Boztepe Köyü | 16.Kurupınar Köyü | 28.Kızılcakışla Köyü |
| 5. Yıldıztepe Köyü | 17.Olukman Köyü | 29.Üzümlük Köyü |
| 6. Çiçekpınarı Köyü | 18.Palanlı Köyü | 30.Kösrelik Köyü |
| 7. Güblüce Köyü | 19.Saraç Köyü | 31.Kocabekir Köyü |
| 8. Evrenköy | 20.Alıçözü Köyü | 32.Boğazkaya Köyü |
| 9. Fatih Köyü | 21.Karşıyaka Köyü | 33.Dereçiftlik Köyü |
| 10.Güngörmez Köyü | 22.Çiftlik Köyü | 34.Mercimekören Köyü |
| 11.Hacılar Köyü | 23.Küçükközlü Köyü | 35.İshaklı Köyü |
| 12.Hatippınarı Köyü | 24.Aydıncık Köyü | |



Arz Ederim

Ali ÇETİNKAYA

DSİ 72. Şube Müdürü
